


	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1	Ö	Loja de Compras Online	72,355 dias?	06/06/22 08:00	14/09/22 10:50		
2		Prospecção	1,26 dias	06/06/22 08:00	07/06/22 10:04		
3		PETEC	0,7 dias	06/06/22 08:00	06/06/22 14:36		
4		Estudar Dominio de Aplicação	0,13 dias	06/06/22 08:00	06/06/22 09:02		
5	Ö	Reunir-se com Fornecedor	0,13 dias	06/06/22 09:02	06/06/22 10:04	4	
6		Redigir PETEC	0,38 dias	06/06/22 10:04	06/06/22 14:07	5	
7		Revisar Proposta Técnica	0,06 dias	06/06/22 14:07	06/06/22 14:36	6	
8		Aprovar PTEC	0 dias	06/06/22 14:36	06/06/22 14:36	7	
9		Est. Prel. Tam.	0,12 dias	06/06/22 14:36	06/06/22 15:33		
10		Estimar Tamanho do Projeto	0,06 dias	06/06/22 14:36	06/06/22 15:04	8	
11		Revisar Estimativa de Tam	0,06 dias	06/06/22 15:04	06/06/22 15:33	10	
12	Ö	Est. Prel. Cronograma e	0,44 dias	06/06/22 15:33	07/06/22 10:04		
13	•	Elaborar Cronograma e Or	0,25 dias	06/06/22 15:33	07/06/22 08:33	11	
14		Revisar Cronograma e Orç	0,19 dias	07/06/22 08:33	07/06/22 10:04	13	
15		Análise	3,67 dias	21/06/22 09:00	24/06/22 15:21	2	
16		Documento de Requisitos	2,92 dias	21/06/22 09:00	24/06/22 08:21		
17		Reunir-se com Cliente	0,25 dias	21/06/22 09:00	21/06/22 11:00	14	
18		Elaborar DRE	1,87 dias	21/06/22 11:00	23/06/22 09:57	17	
19		Revisar DRE	0,8 dias	23/06/22 09:57	24/06/22 08:21	18	
20		Submeter DRE para Aprov	0 dias	24/06/22 08:21	24/06/22 08:21	19	
21	•	MRB	0,75 dias	24/06/22 08:21	24/06/22 15:21		
22		Elaborar MRB	0,56 dias	24/06/22 08:21	24/06/22 13:50	20	
23		Revisar MRB	0,19 dias	24/06/22 13:50	24/06/22 15:21	22	
24		Projeto	3,26 dias	24/06/22 15:21	30/06/22 08:26	15	
25		Diagrama de Classes	1,5 dias	24/06/22 15:21	28/06/22 10:21		
26	•	Elaborar Diagrama de Classe	0,75 dias	24/06/22 15:21	27/06/22 13:21	23	
27		Implementar RF18 - Editar	0,25 dias	24/06/22 15:21	27/06/22 08:21		
28		Atualizar MRB	0,5 dias	27/06/22 15:21	28/06/22 10:21	30	
29		Modelo Entidade Relacio	3,26 dias	24/06/22 15:21	30/06/22 08:26		
30		Revisar Diagrama de Classe	1 dia	24/06/22 15:21	27/06/22 15:21		
31		Elaborar Mer	0,5 dias	29/06/22 13:26	30/06/22 08:26	28	
32		Planejamento	3,25 dias?	30/06/22 08:26	05/07/22 10:26	24	
33		Elaborar Estimativa de Tama	1,75 dias	30/06/22 13:26	04/07/22 10:26	59	
34		Elaborar Cronograma Definit	1 dia	04/07/22 10:26	05/07/22 10:26	33	

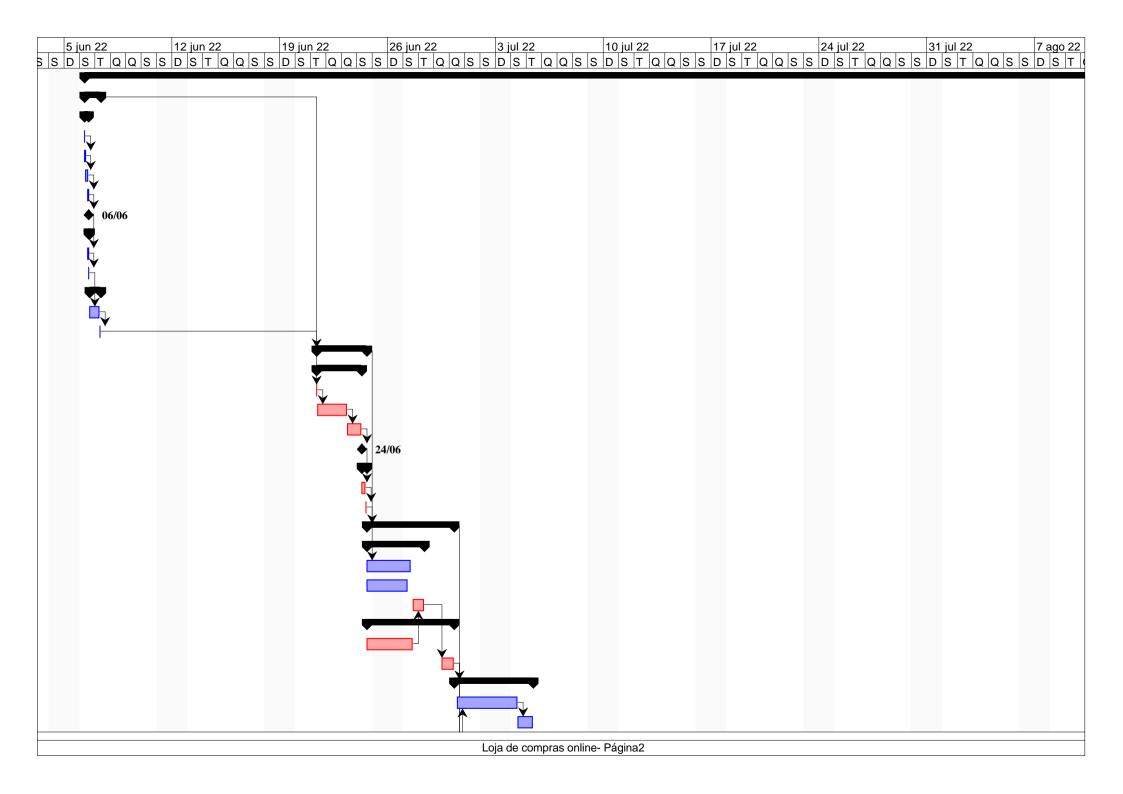

			04 00		laa aa	4 .00			140 400	105 100		0
	14	ago 22	21 ago 22		28 ago 22	4 set 22	11 Se	et 22	18 set 22	25 set 22	2 out 22	9 out 22 S S D S T Q Q S
ע ע א	o  υ	5   1   4   4   5   5	ען ון פן טן פ	Q S S	ון פן ען  Q	3   3   U   3   I   Q   Q	1 2 2 D S		ון פן טן פ	אן אן אן זון פן ען פ	ון פן טן טן וון ען ען פּן	ון פן ען פן פ
								_				
				·		Loja	de compras c	online- Página	3			

	<b>(A)</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
35		Elaborar Orçamento Definitivo	1 dia?	30/06/22 08:26	01/07/22 08:26		
36	Ö	Desenvolvimento	52,3 dias	30/06/22 08:26	12/09/22 10:50	31	
37		Implementar RFC01 - M	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
38		Implementar RF01 - Incluir	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
39		Implementar RF02 - Editar	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
40		Implementar RF03 - Consu	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
41		Implementar RF04 - Remo	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
42		Implementar RFC02 - M	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
43		Implementar RF05 - Incluir	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
44		Implementar RF06 - Editar	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
45		Implementar RF07 - Cons	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
46		Implementar RF08 - Remo	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
47		Implementar RFC03 - M	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
48		Implementar RF09 - Incluir	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
49		Implementar RF10 - Editar	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
50		Implementar RF11 - Procu	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
51		Implementar RF12 - Remo	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
52		Implementar RFC04 - M	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
53		Implementar RF13 - Incluir	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
54		Implementar RF14 - Editar	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
55		Implementar RF15 - Consu	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
56		Implementar RF16 - Remo	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
57		Implementar RFC05 - Re	0,5 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 13:26		
58		Implementar RF17 - Fazer	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
59		Revisar Mer	0,5 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 13:26	31	
60		Implementar RF20 - Remo	0,25 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:26		
61		Implementar RFC06 - Mante	0,3 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:50		
62		Implementar RFC07 - E	52,3 dias	30/06/22 08:26	12/09/22 10:50		
63		Implementar RF21 - Emitir	0,3 dias	30/06/22 08:26	09/09/22 10:50		
64		Implementar RF22 - Emitir	0,3 dias	30/06/22 08:26	12/09/22 10:50		
65		Implementar RF23 - Emitir	0,3 dias	30/06/22 08:26	12/09/22 10:50		
66		Implementar RNF01 - Cripto	0,3 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:50		
67		Implementar RNF02 - Limitar	0,3 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:50		
68		Implementar RNF03 - Toda	0,3 dias	30/06/22 08:26	30/06/22 10:50		

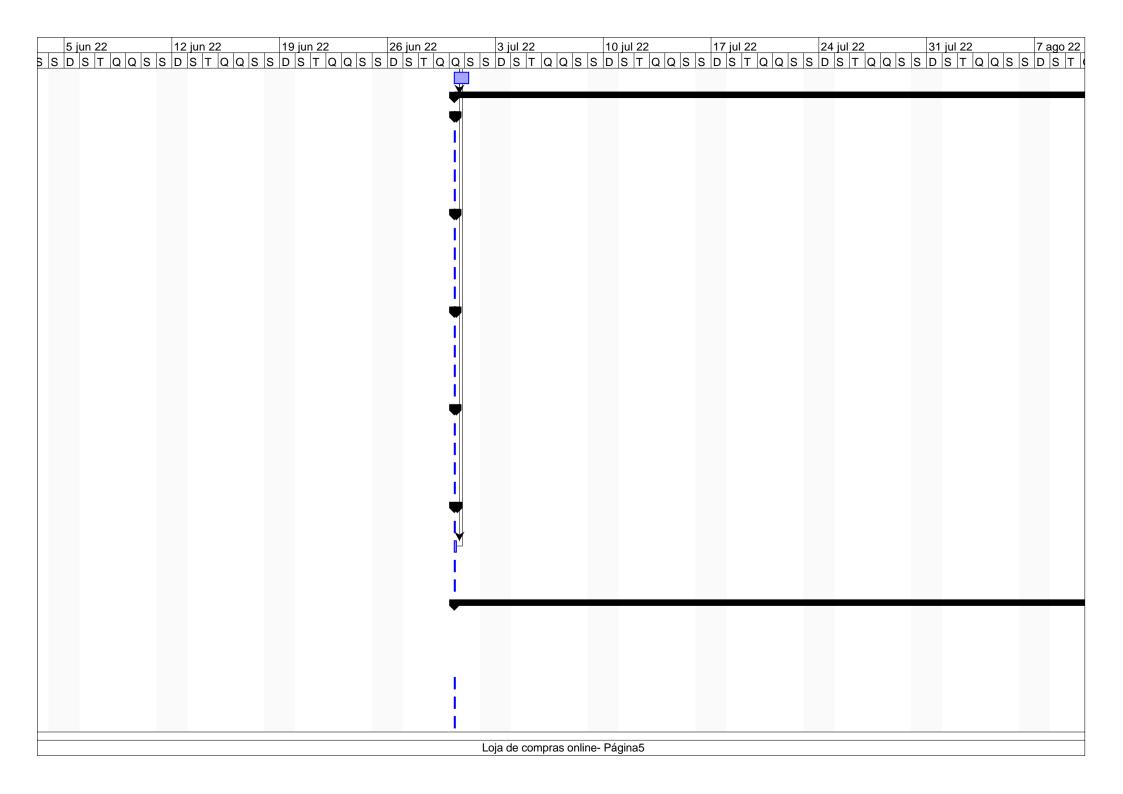

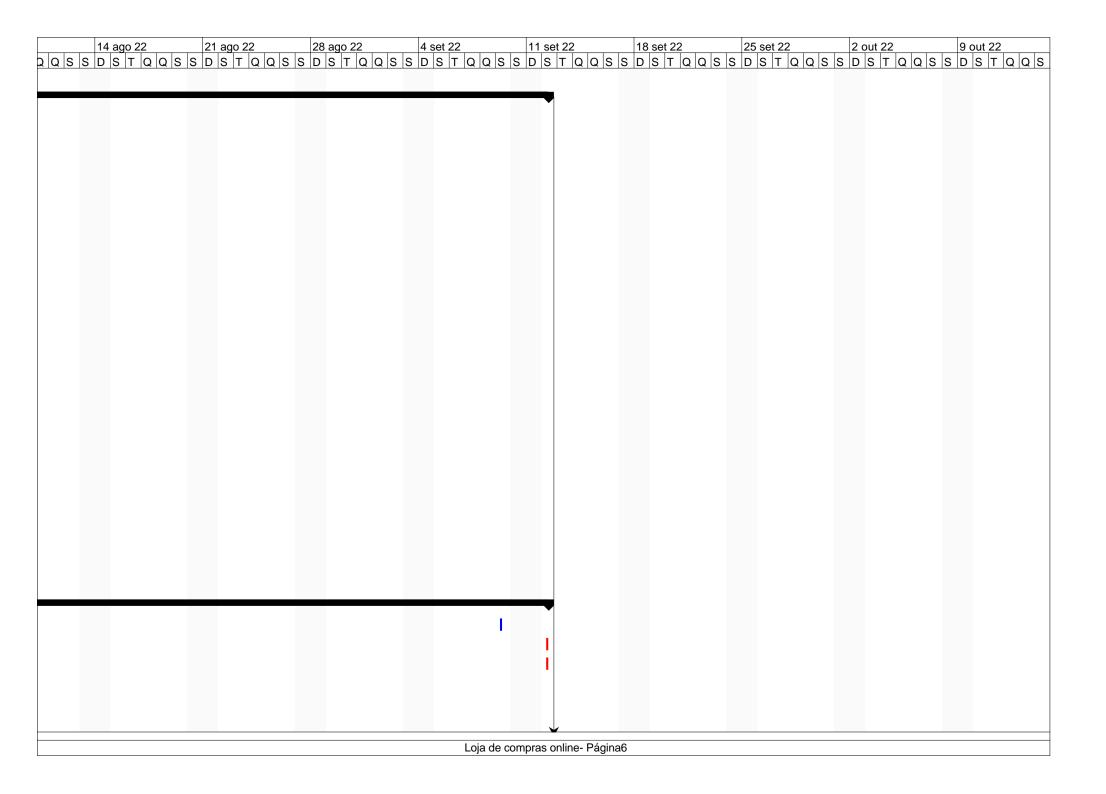

	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
69		Monitoramento e Controle	0,75 dias	12/09/22 10:50	13/09/22 08:50	36	
70		Acompanhar Projeto	0,75 dias	12/09/22 10:50	13/09/22 08:50		
71		Gerrencia de Configuração	0 dias	13/09/22 08:50	13/09/22 08:50	69	
72		Elaborar Branch	0 dias	13/09/22 08:50	13/09/22 08:50		
73		Elaborar Merge da Branch X	0 dias	13/09/22 08:50	13/09/22 08:50		
74		Fechamento	1 dia?	13/09/22 08:50	14/09/22 08:50	71	
75		Elaborar Relatório de Lições	1 dia?	13/09/22 08:50	14/09/22 08:50		
76		Atualizar Base de Dados Hist	1 dia?	13/09/22 08:50	14/09/22 08:50		
77		Controle de Mudança	0,25 dias	14/09/22 08:50	14/09/22 10:50	74	
78		Implementar RF19 - Consult	0,25 dias	14/09/22 08:50	14/09/22 10:50		

